


PLAN DE AVANCE									
N°	Rubros	Monto	% incid.	Masas de obra					
	Designación			1	2	3	4	5	6
1	TRABAJOS PRELIMINARES	\$ 98.961,47	1,23%	100%					
				1,23					
2	DEMOLICIONES	\$ 134.632,47	1,68%	100%					
				1,68					
3	MOVIMIENTOS DE SUELO	\$ 38.120,59	0,48%	100%					
				0,48					
4	EXCAVACIONES	\$ 35.659,36	0,44%	100%					
				0,44					
5	ESTRUCTURA RESISTENTE	\$ 1.348.461,39	16,83%		45%	35%	20%		
					7,57	5,89	3,37		
6	MAMPOSTERÍA	\$ 587.035,34	7,32%	5%	25%	35%	35%		
				0,37	1,83	2,56	2,56		
7	AISLACIONES	\$ 53.593,15	0,67%		100%				
					0,67				
8	CUBIERTAS DE TECHO	\$ 208.635,21	2,60%			50%	50%		
						1,30	1,30		
9	REVÓQUES	\$ 485.123,01	6,05%		25%	30%	35%	10%	
					1,51	1,82	2,12	0,61	
10	CIELORRASOS	\$ 167.327,61	2,09%		15%	15%	40%	30%	
					0,31	0,31	0,83	0,63	
11	CONTRAPISOS	\$ 286.547,41	3,57%		40%	40%	20%		
					1,43	1,43	0,71		
12	SOLADOS	\$ 515.494,88	6,43%		10%	35%	45%	10%	
					0,54	2,25	2,89	0,64	
13	REVESTIMIENTOS	\$ 74.950,69	0,93%				30%	50%	20%
							0,28	0,47	0,19
14	MARMOLERÍA	\$ 100.391,23	1,28%				100%		
							1,25		
15	VIDRIOS	\$ 194.777,51	2,43%				20%	60%	20%
							0,49	1,46	0,49
16	PINTURAS	\$ 722.523,10	9,01%					20%	80%
								1,80	7,21
17	CARPINTERÍAS	\$ 959.995,62	8,23%		15%	20%	45%	20%	
					1,23	1,66	3,70	1,56	
18	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	\$ 1.072.802,96	13,38%		15%	15%	15%	35%	20%
					2,01	2,01	2,01	4,68	2,68
19	INSTALACIÓN SANITARIA	\$ 319.761,10	3,99%		15%	35%		50%	
					0,60	1,40		1,99	
20	INSTALACIÓN DE GAS	\$ 42.319,65	0,53%		100%				
					0,53				
21	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	\$ 56.604,91	0,71%					50%	50%
								0,35	0,35
22	INSTALACIONES ESPECIALES	\$ 556.820,63	6,95%					100%	
								6,95	
23	OBRAS EXTERIORES	\$ 121.999,16	1,52%			20%		50%	30%
						0,30		0,76	0,48
24	VARIOS	\$ 133.679,77	1,67%		10%	10%	20%	20%	40%
					0,17	0,17	0,33	0,33	0,67

TOTAL	\$ 8.017.228,77	100,00%						
% de Avance Mensual Previsto	4,20	18,51	21,08	21,88	22,32	12,04		
% de Avance Acumulado Previsto	4,20	22,71	43,79	65,65	87,96	100,00		
Monto de Inversión Mensual Previsto	336.725,65	1.463.723,47	1.690.380,26	1.752.164,71	1.789.335,83	964.898,82		
Monto de Inversión Acumulado Previsto	336.725,65	1.820.449,12	3.510.829,40	5.262.994,11	7.052.329,95	8.017.228,77		
% de Avance Mensual Ejecutado								
% de Avance Acumulado Ejecutado								
Monto de Inversión Mensual Ejecutado								
Monto de Inversión Acumulado Ejecutado								

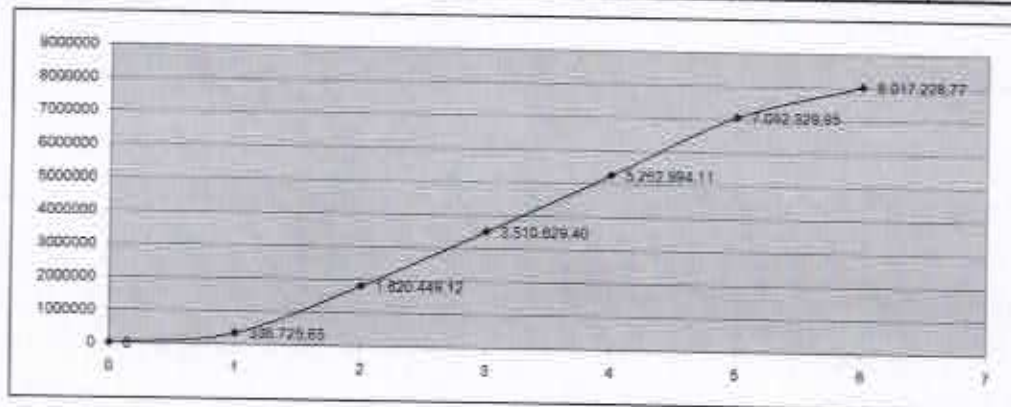

Arq. María Belén Villegas
 Inspecciones
 Ministerio de Educación

ARS. ROLOV D. GUZZINI
 Jefe de Área Técnica
 Sub Dir. de Jefe de Infraestructura
 Ministerio de Educación
